PAUL SCHERRER INSTITUT

SINQ Upgrade Gesamtterminplan

SINQ Upgrade
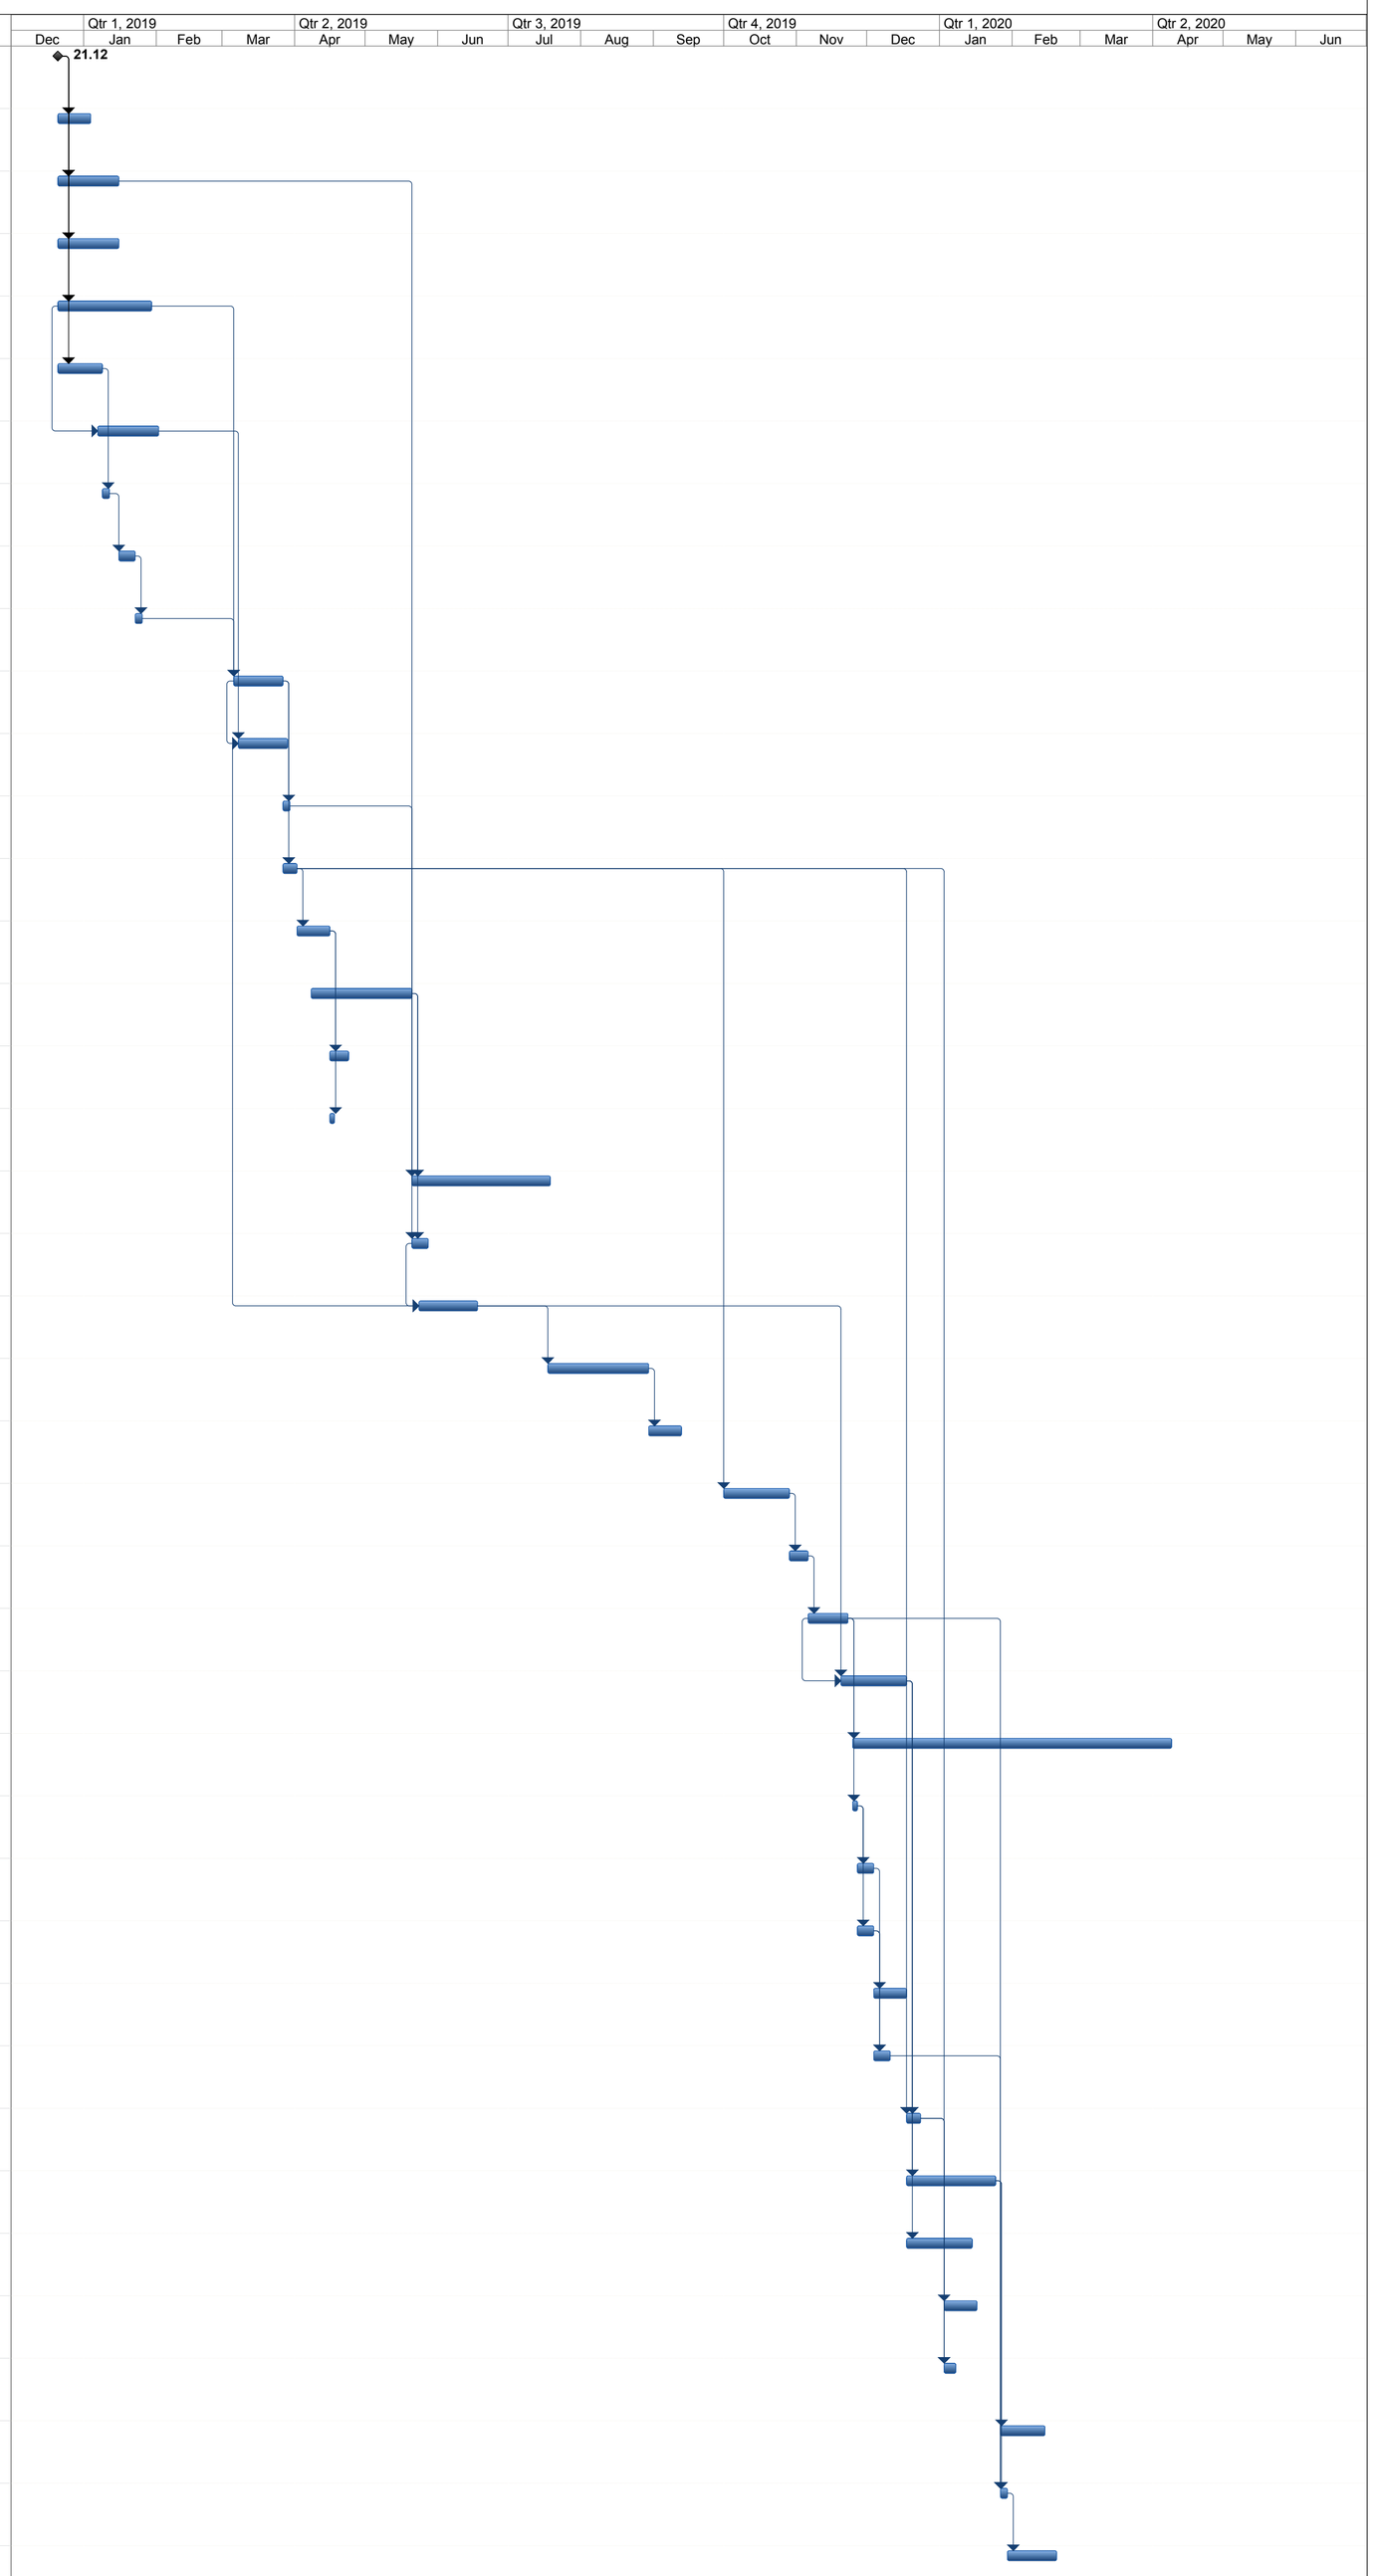
ID	Name	Duration
433	Ende Strahl auf SINQ-Target	0 dys
479	Entleeren u. Entfernen 3 Bortanks in NL-Bunker	2 dys
480	Rückbau Elektro in NL-Bunker	10 dys
481	Rückbau Vakuuminfrastruktur in NL-Bunker	10 dys
483	Abbau NL in NL-Bunker 1. Teil (soweit möglich durch Eingang Bunker)	20 dys
513	Abbau Vakuum-/Shuttersteuerung/Elektro auf Galerie WNLA	5 dys
484	Stützen neue Bohrungen oben u. unten	20 dys
514	Abbau Galerie WNLA	3 dys
515	Abbau 3m-Wand zu (unter Galerie)	5 dys
522	Rampe RITA-Areal zu NL-Bunker (Mass nehmen, fertigen, montieren)	3 dys
485	Abbau NL in NL-Zwischenbunker 2. Teil (inkl. Stützen, Shutters, Geschw.selektor)	15 dys
487	Stützen neue Bohrungen oben u. unten	15 dys
486	Spickel in Abschirmung in Bunkerwand ausfräsen	3 dys
491	PE-Wand Teilaufbau Gestell einbringen u. füllen (PE+Stahl) (nach RNR17 Einbau)	4 dys
500	Shutterabschirmung aareseitig Gestell einbringen u. füllen (PB)	10 dys
477	NL gesperrt wegen Umbau Sektor 10	29 dys
501	Shutterabschirmung bergseitig Gestell einbringen u. füllen (FE)	4 dys
510	Vakuum Turbobalken montieren (an Shutterabschirmung)	2 dys
482	Aufbau neue Elektro-Infrastruktur (Pritschen, Licht, Verkabelungen...)	40 dys
488	Vermessung Anzeichnen neue Stützenpositionen	5 dys
489	Setzen, einjustieren u. untergiessen Stützen	15 dys
498	NL RNR11/12/13 einbauen	30 dys
499	Be-Filter installieren (in RNR11)	10 dys
492	NL RNR17 einbauen	20 dys
493	Wiederaufbau AMOR-Chopperunit (beinhaltet Polarisation)	5 dys
494	NL RNR16 einbauen	13 dys
496	NL RNR14/15 einbauen	20 dys
495	Verkabelung Chopper, Blende und Justagemotoren RNR17	90 dys
504	Montage Instrumententisch f. Geschwindigkeitsselektoren	2 dys
505	Montage Geschwindigkeitsselektor f. SANS-LLB	5 dys
506	Montage Geschwindigkeitsselektor f. SANS-1	5 dys
507	Kühlung u. Elektroversorgung Neuinstallation Geschwindigkeitsselektoren	10 dys
508	Abschirmung Geschwindigkeitsselektoren SANS-LLB und SANS-1 aufbauen	5 dys
497	PE-Wand 2, Teil Gestell einbringen u. füllen (PE+Stahl)	4 dys
502	Montage aller NL-Shutter	20 dys
511	Einbau neuer Vakuuminstallationen (Ventile, Messzellen, Pumpen) u. anschliessen	12 dys
509	Vorvakuumsystem aufbauen (nach PE-Wänden u. Stützen)	10 dys
512	Einbau Türe zw. PE-Wänden	3 dys
503	Anschluss der Shutter (Druckluft, Signalschalter)	15 dys
516	Aufbau 3m-Wand	3 dys
517	Aufbau Galerie WNLA	15 dys
