PAUL SCHERRER INSTITUT

SINQ Upgrade Gesamtterminplan

SINQ Upgrade
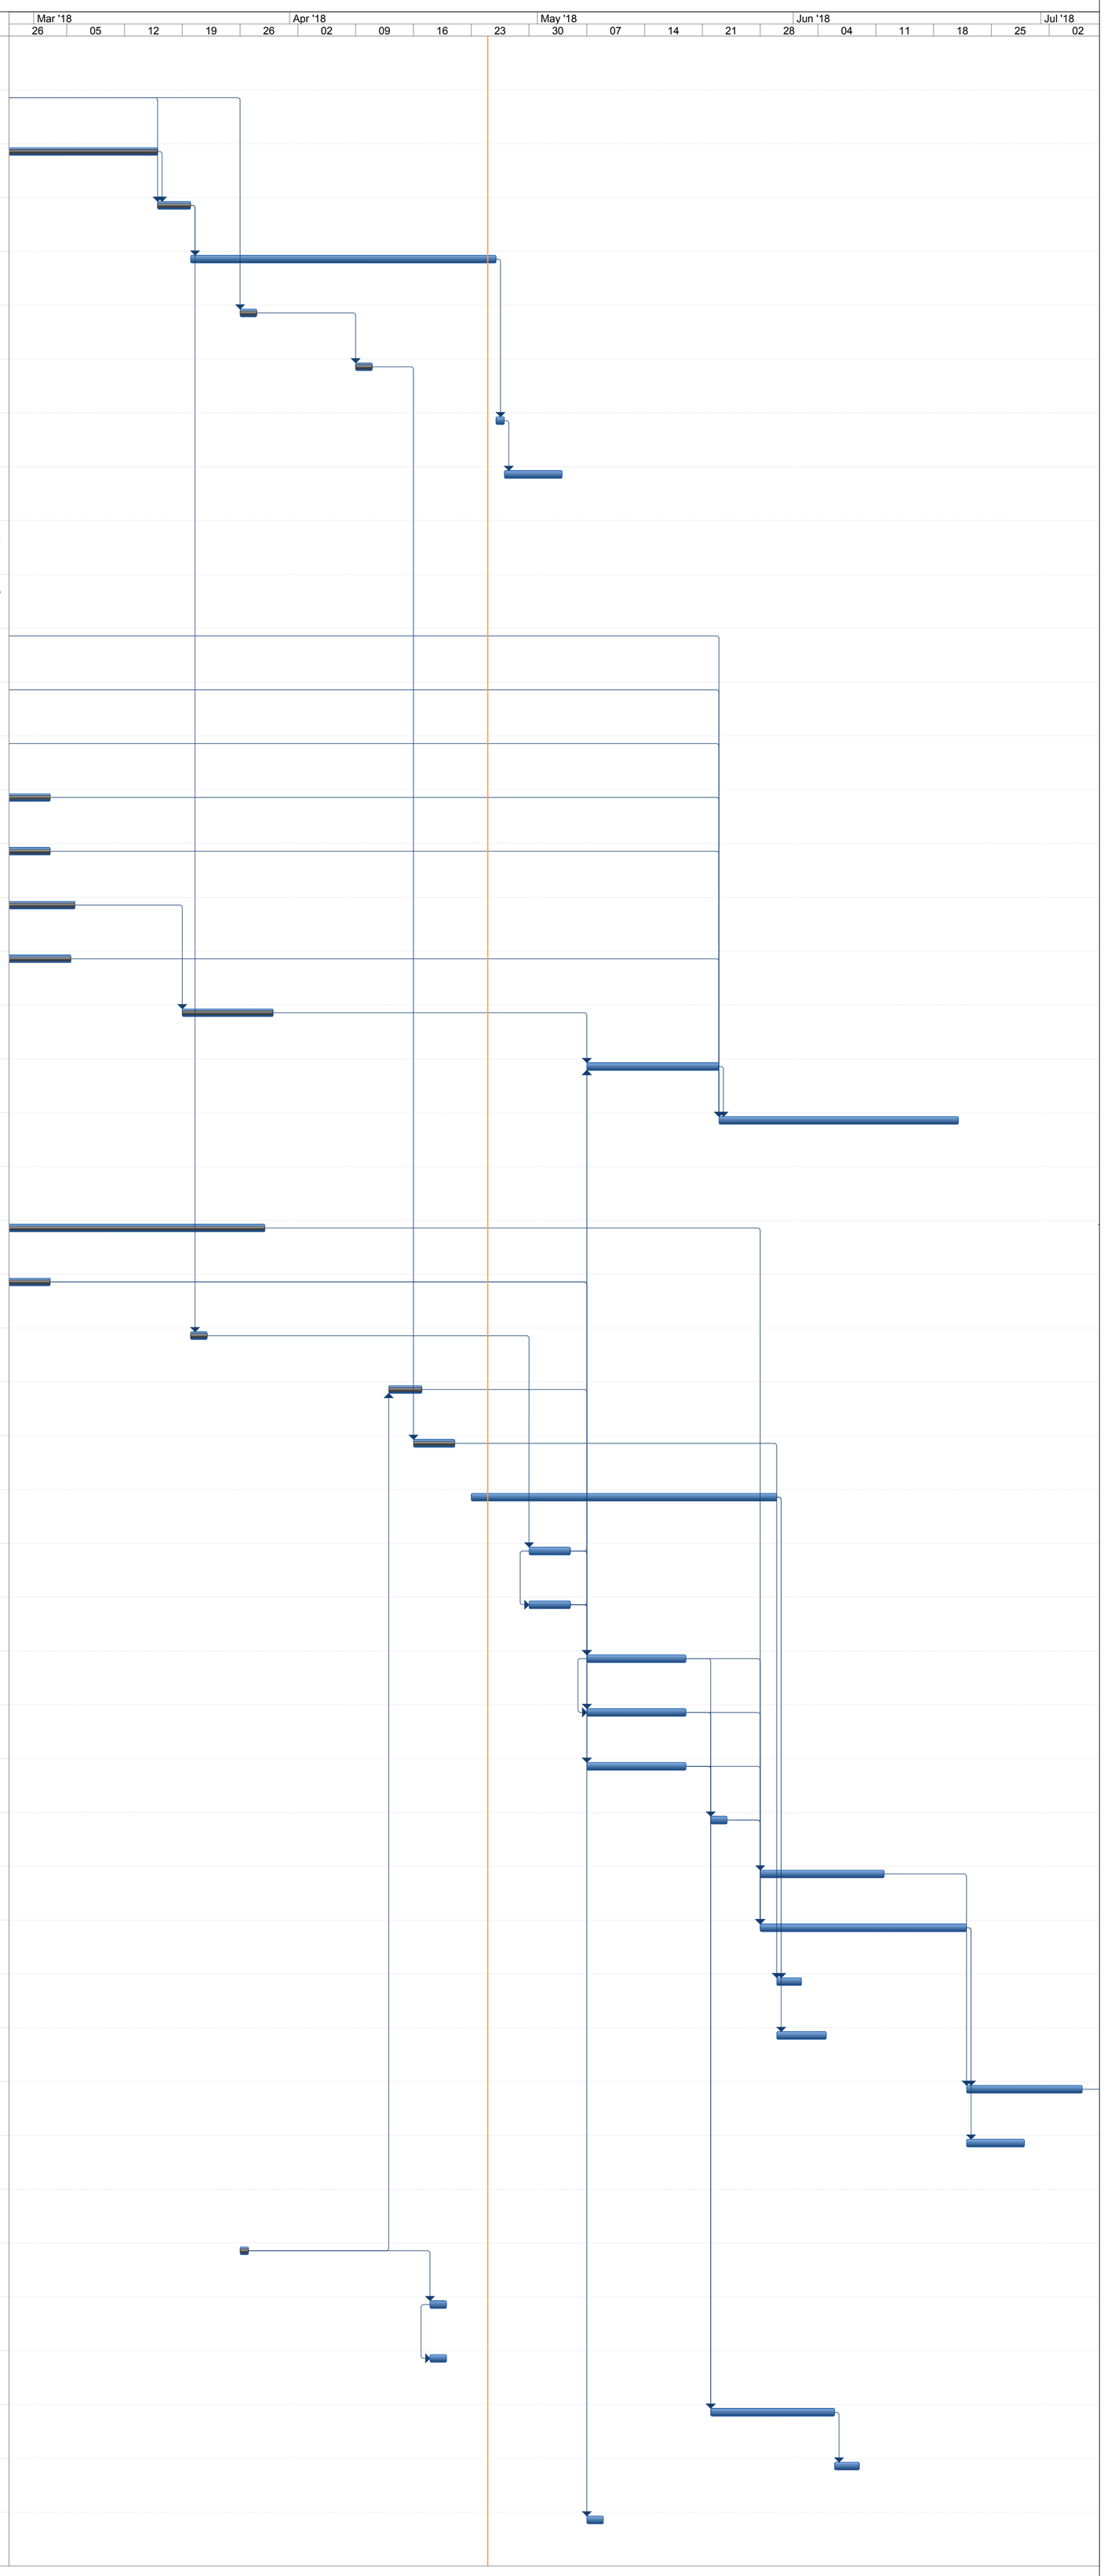
ID	Name	Duration
365	Kabelkanäle Region MARS-Grube definieren u. Pläne erstellen	98 dys
367	MARS-Grube füllen, Kabelkanäle erstellen	7 dys
366	Kabelkanalabdeckungen Platten fertigen (externe Firma)	19 dys
370	Kabelkanalabdeckungen einlegen	2 dys
371	Kabelkanalabdeckungen neue Platten fertigen (externe Firma)	25 dys
368	Deckbelag von Fa. WALO	2 dys
369	MARS-Grube-Region streichen	2 dys
372	Neue Kabelkanalabdeckungen einlegen	1 dy
373	Kabelkanalabdeckungen Ecken Mass nehmen, fertigen u. einlegen	5 dys
351	Schränke (mechan. U. Neutronenoptik) wegräumen	0.5 dys
352	Bestrahlte-Proben-Tresor versetzen	0.5 dys
353	MARS-Kabine räumen (Racks)	5 dys
354	Drucker entfernen	1 dy
355	Materialllager-Schränke räumen u. entfernen	1 dy
356	Neutronenoptikraum räumen	10 dys
357	Computerraum räumen	10 dys
359	Elektr. Installationen über Werkstatt entfernen (soviel nötig für SU-Messungen)	11 dys
358	Bestrahlte-Proben-Raum räumen, Proben in Proben-Tresor	10 dys
360	SU-"Frei"messungen (soviel möglich)	9 dys
361	Restliche Elektroinstallationen oberhalb LDM-Werkstatt rückbauen	10 dys
362	Rückbau Gebäudehülle oberhalb LDM-Werkstatt	20 dys
363	Rückbau alte LDM-Werkstatt (bleibt Lagerraum bis 2020)	18 dys
375	Pflichtenheft für LDM-Werkstatt u. Probenumgebung	28 dys
378	Elektroinstallationen Bereich Türen-/Fensteränderung entfernen	5 dys
376	Probenumgebungs-Vorbereitungsraum Richtung MARS zügeln (ausserhalb Grube)	2 dys
381	Ganze Front entfernen	2 dys
377	Probenumgebungs-Vorbereitungsraum Richtung MARS zügeln (innerhalb Grube)	5 dys
386	Klimagerät Bestellung bis Lieferung	25 dys
379	Licht (u. Brandmelder?) Region neue Trennwand entfernen/anpassen	5 dys
380	Elektroinstallation bei Durchbruch zu Anbau entfernen	5 dys
382	Neue Türe zu Einstellraum Probenumgebung	9 dys
383	Neue Türe zu LDM-Werkstatt	9 dys
384	Trennwand einziehen	9 dys
385	Boden in neuer LDM-Werkstatt versiegeln	2 dys
389	Druckluftnetz erschliessen	10 dys
390	Infrastruktur elektrisch (Licht, Anschlüsse, Maschinen Werkstatt)	18 dys
387	Klimagerät innen montieren	2 dys
388	Klimagerät aussen montieren, anschliessen u. IBN	3 dys
391	Umzug LDM-Werkstatt (alte Werkstatt bleibt Lagerraum bis 2020)	10 dys
392	Bezug Probeumgebung innen	5 dys
393	Bezug Probeumgebung Anbau	60 dys
395	Treppe Süd-West entfernen	1 dy
396	SU-Zone versetzen	2 dys
397	Hand-/Fussmonitor	2 dys
398	Treppe Süd-West an neuem Standort aufbauen	10 dys
399	Treppe zu N2-Abfüllstation rückbauen (und Geländer oben ergänzen)	3 dys
550	Durchbruch WNLA zu Anbau fertigen	2 dys
